



Info om JMs pågående byggnation i Bolinder Strand - Januari 2020


Bolinder Terrass, 174 bostadsrätter

Produktionen pågår för fullt i ena änden av projektet (punkthuset med 16 våningar) samtidigt som inflyttning har startat i andra änden av huset (lamellhuset). Utvändigt kvarstår tak och fasadarbeten i punkthuset samt finplaneringsarbeten omkring hela huset. I höst kommer projektet vara helt färdigställt och sista inflyttning beräknas ske i november 2020.

Det finns fortfarande ett antal bostäder till salu. För mer information om projektet och tider för kommande visningar i våra nya visningsbostäder se www.jm.se/bolinder-terrass.

Bolinder Entré, 80 ägarlägenheter

Vid Bolinder Entré pågår flytt av vägkorsningen Fabriksvägen/Godsvägen som är en förutsättning för att huset ska få plats. Vi planerar att lägga om trafiken och starta markarbeten för själva huset i mars och gjutning av bottenplattan planeras under försommaren. Sedan pågår byggnationen av det 16 våningar höga huset i cirka 1,5 år. Inflyttning är planerat till första kvartalet 2022.

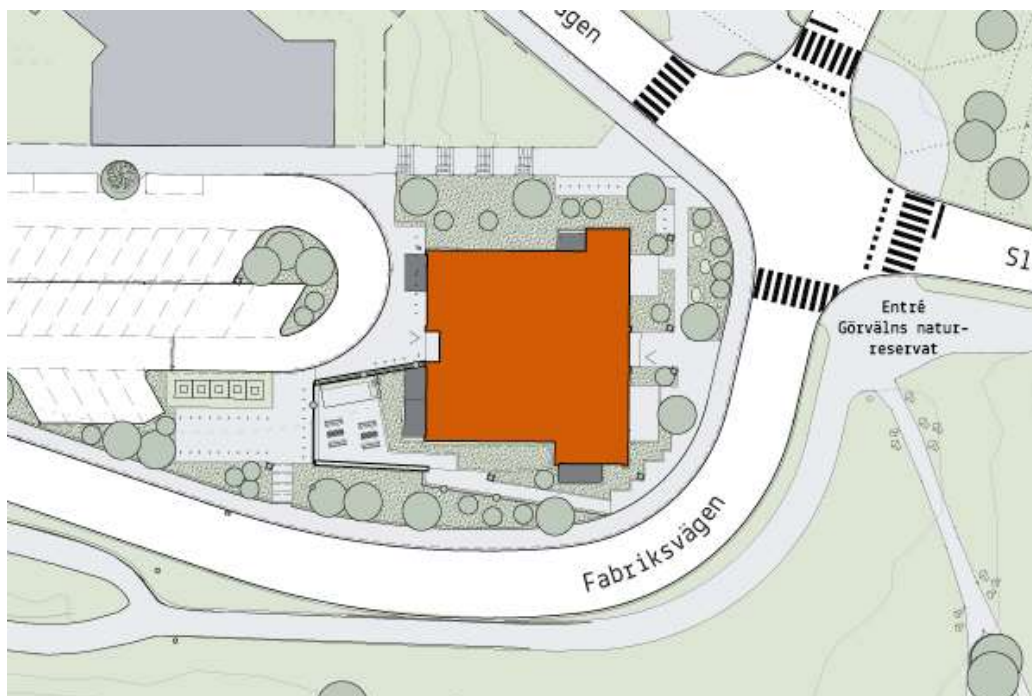

Under våren kommer det ske spontning, sprängning och pålning som kan upplevas störande. Det är svårt att avgöra exakt hur länge dessa arbeten kommer pågå, men planen är att de är klara i maj. Arbetstiderna för markarbetena under vinter/vår 2020 är vardagar 06.30 – 16.00. Vi undviker bullrande arbete innan 7.00.

Försäljning av ägarlägenheterna startade under hösten och pågår för fullt. Läs mer om projektet på www.jm.se/bolinder-entre.

Kontakt

Försäljning: carina.lindahl@nytthem.se

Övriga frågor: info@jm.se
